RELATÓRIO MENSAL

- **CONCESSIONÁRIA:** **VIABAHIA**
- **RODOVIA:** **BR-324/BA; BR-116/BA**

  BA-526; BA-528
- **TRECHO:** **SALVADOR – FEIRA DE SANTANA**

  FEIRA DE SANTANA – DIV. BA/MG
- **EXTENSÃO:** **680,5 KM**

SALVADOR – BA

OUTUBRO DE 2014

– ÍNDICE –

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA
1.	Informações da Concessão	3
1.1.	Introdução	3
1.2.	Informações Contratuais	5
1.3.	Mapa de Situação	7
2.	Acompanhamento e Controle das Principais Obras	8
2.1.	Descrição das Principais das Obras	8
2.2.	*Status* das Principais Obras	9
2.3.	Cronograma Físico	10
2.4.	Avanço Físico	11
3.	Frente de Serviço Operacional	12
3.1.	Status dos Serviços Operacionais	12
4.	Relação de Equipamento e Pessoal	14
5.	Relatório Fotográfico	15
6.	Considerações Finais	19
7.	Termo de Encerramento	20

1. Informações da Concessão

A VIABAHIA tem como objetivo a concessão da exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade do Sistema Rodoviário, por 25 anos. Essas atividades deverão oferecer serviços de alta qualidade garantindo a segurança, conforto e fluidez do tráfego para os usuários, respeitando o meio ambiente, interagindo com a comunidade lindeira das rodovias.

1.1. Introdução

Desde o dia 19 de outubro de 2009, a VIABAHIA Concessionária de Rodovias S.A, é responsável pela administração e operação de 554,132 km da BR-116/BA de Feira de Santana a divisa BA/MG, 113,233 km da BR-324/BA de Salvador a Feira de Santana, 9,3 km da BA-526 da entrada da BR-324 a entrada da BA-528 e 4,0 km da BA-528 da entrada BA-526 até o acesso Base Naval de Aratu.

O presente relatório tem como objetivo divulgar através do site da Agência Reguladora as informações sobre as principais obras desempenhadas pela Concessionária.

Principais canais de comunicação com a concessionária são:

Serviço de Atendimento ao Usuário:

0800 6000 116

0800 6000 324

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 8000 888

Endereço Eletrônico:

www.viabahiasa.com.br

Missão

Garantir a qualidade da infraestrutura e dos serviços ao longo das rodovias concedidas, com consciência ambiental, mantendo um excelente relacionamento com os usuários e seus colaboradores, e atendendo as expectativas dos seus acionistas.

Visão

Ser referência no gerenciamento rodoviário do Nordeste, modernizando as rodovias sob sua concessão, protegendo o meio ambiente, adotando padrões de qualidade, segurança e conforto que atendam os interesses das partes relacionadas.

Valores

- Aplicar o código de Ética;
- Cordialidade e cooperação;
- Transparência nas relações;
- Esmero no atendimento;
- Aperfeiçoamento profissional;
- Responsabilidade na execução das tarefas;
- Maximização dos resultados;
- Consciência Ambiental;
- Padrão de Qualidade.

A Concessionária encontra-se no 5º Ano de Concessão, desempenhando o Investimento de Recuperação, realizando as obras de cunho estrutural no pavimento e de melhorias funcionais e operacionais nos demais elementos do Sistema Rodoviário.

1.2. Informações Contratuais

BR-116/BA – Feira de Santana à Divisa BA/MG - 554,1 km de extensão (km 420+300 ao km 936+800 – PNV 2003)

BR-324/BA – Salvador à Feira de Santana - 113,2 km de extensão (km 512+600 ao km 626+200 – PNV 2003)

BA- 526 – Entroncamento BR-324 ao Entroncamento BA-528 - 9,3 km de extensão

BA-528 – Entroncamento BA-526 ao Acesso Base Naval de Aratu - 4 km de extensão

Edital n.º: 001/08

Data de assinatura do contrato: 03/09/2009

Data do extrato do contrato em DOU: 04/09/2009

Data de Assunção: 19/10/2009 (publicação em DOU do Termo de Arrolamento e Transferência pelo DNIT)

Data base do contrato: Dezembro/2005

Valor TBP Inicial: R$ 2,212 (praças P03, P04, P05, P06 e P07); R$ 1,261 (praças P01 e P02).

Valor TBP Vigente: R$ 3,10 (praças P03, P04, P05, P06 e P07); R$ 1,70 (praças P01 e P02).

IRT vigente: 1,49664

Concessionária: VIABAHIA Concessionária de Rodovias S/A

Telefone/Fax: 00 55 71 3025-9800; endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães, n.º 3244 – 16º Andar; Sala 1600 – Bairro: Caminho das Árvores, CEP 41800-700 Salvador/BA; e-mail para contato: ouvidoria@viabahiasa.com.br; sítio eletrônico www.viabahiasa.com.br.

Tabela 01 – Dados Contratuais

DADOS CONTRATUAIS	
Concessionária	VIABAHIA Concessionária de Rodovias AS
Contrato Nº	Edital n.º 001/2008
Escopo do Contrato	Trabalhos Iniciais, Recuperação, Manutenção, Conservação, Monitoração, Operação e a Exploração da Rodovia e Respectivos Acessos, Mediante Cobrança de Pedágio
Data da Assinatura do Contrato	03/09/2009
Data de Início da Concessão	20/10/2009
Início da Cobrança de Pedágio	07/12/2010
Rodovia	BR-324/BA;BR-116/BA;BA-526 e BA-528
Trecho	Salvador - Feira de Santana e Feira de Santana - Div. BA/MG
Extensão (km)	680,60
Prazo	25 anos

1.3. Mapa de Situação

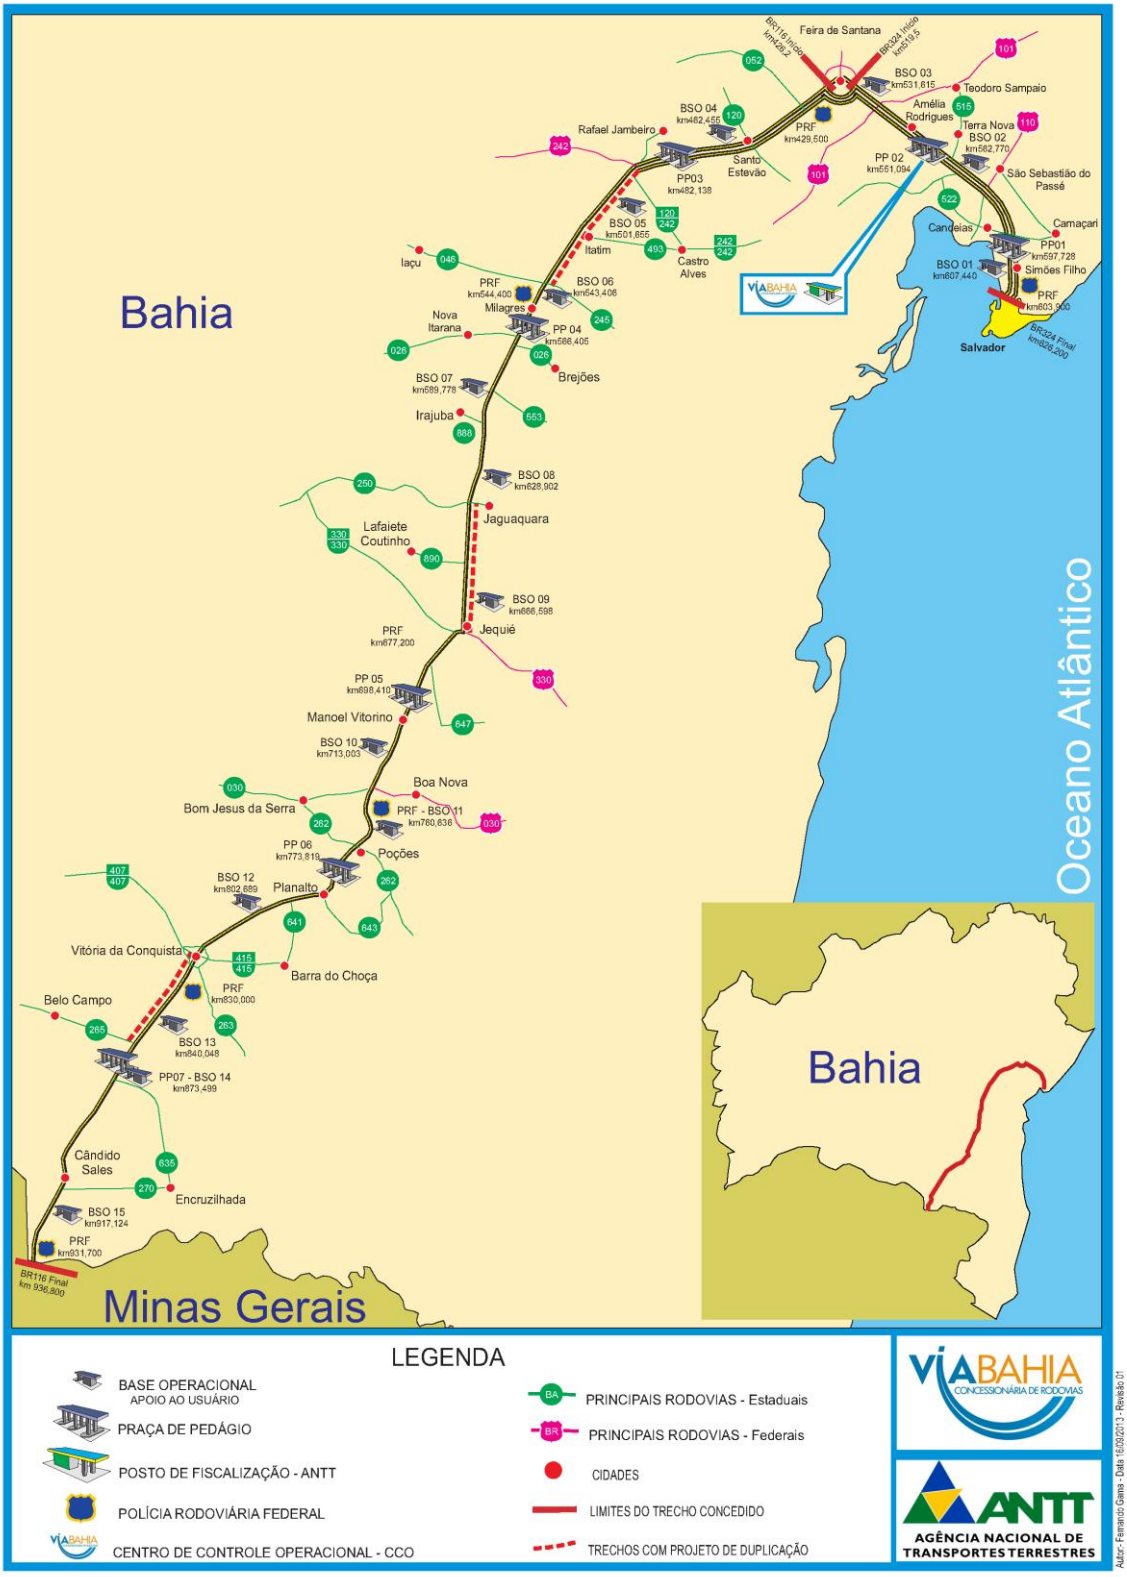

Figura 01 – Mapa de Situação

2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras

2.1. Descrição das Principais das Obras

- **Pavimento:** Continuam as obras de recuperação de Pavimento nas rodovias BR-324 e BR-116, com execução dos serviços de Fresagem Recomposição com CBUQ e implantação de Drenagem Profunda.

- **Elementos de Proteção e Segurança:** Continua a execução dos serviços de recuperação de Elementos de Proteção e Segurança, com a implantação de Defensas Metálicas, de Sinalização Horizontal e Vertical, através da instalação de placas, delineadores, tachas refletivas e implantação de pinturas refletivas (faixas de eixos e bordos).

- **Obras de Arte Especiais:** Em andamento obras de Alargamento e Reforço Estrutural das Obras de Arte na BR-324 e BR-116.

- **Sistemas de Drenagem e Obras-de-arte Correntes:** Está em andamento a implantação de drenagem superficial (sarjetas/canaletas), e a recuperação das obras de arte corrente na BR-324 e BR-116.

- **Sistemas Elétricos e de Iluminação:** Concluídas as obras de Implantação de Iluminação.

- Continuam as obras de **Duplicação** com execução dos serviços de Drenagem, de Obras de Arte Especiais, Terraplenagem, Pavimentação, Iluminação e remanejamento de interferências

- A partir da definição da localização das passarelas a serem implantadas no Sistema Rodoviário, a VIABAHIA deu início à elaboração e envio à Agência dos projetos necessários. Foram aprovados 25 locais para implantação de passarelas.

2.2. *Status* das Principais Obras

Tabela 02 – Status das Principais Obras

ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS OBRAS

Item PER	Descrição da Obra	Localização		Extensão	Período			Acompanhamento	
		Km Inicial	Km Final	km	Data Inicial	Data Final	Prazo (mes	Status	Realizado (%)
2	RECUPERAÇÃO								
2.1	Pavimento								
	BR-324 - do km 519 ao km 547/ Pista Leste	519,000	547,000	28,000	abr-14	jan-15	9,30	Andamento	37%
	BR-324 - do km 548 ao km 580/ Pista Leste	548,000	580,000	32,000	fev-14	jan-15	11,13	Andamento	73%
	BR-324 - do km 581 ao km 603/ Pista Leste	581,000	603,000	22,000	jul-14	out-14	3,07	Andamento	55%
	BR-324 - do km 617 ao km 582/ Pista Oeste	617,000	582,000	35,000	ago-14	dez-14	4,07	Andamento	6%
	BR-324 - do km 580 ao km 561/ Pista Leste	581,000	561,000	20,000	abr-14	jul-14	3,03	Concluída	100%
	BR-324 - do km 580 ao km 561/ Pista Oeste	581,000	561,000	20,000	jan-14	abr-14	3,00	Concluída	100%
	BR-324 - do km 545 ao km 541/ Pista Leste	545,000	541,000	4,000	mar-14	nov-14	8,17	Andamento	40%
	Anel Viário de Feira	-	-	32,000	set-14	jun-15	9,10	Andamento	15%
	BR-116 - do km 430 ao km 444	430,000	444,000	14,000	out-14	jun-15	8,10	Andamento	1%
	BR-116 - do km 447 ao km 454	447,000	454,000	7,000	abr-14	out-14	6,10	Andamento	43%
	BR-116 - do km 454 ao km 459	454,000	459,000	5,000	out-14	jun-15	8,10	Andamento	1%
	BR-116 - do km 465 ao km 467	465,000	467,000	2,000	nov-14	mar-15	4,00	Andamento	90%
	BR-116 - do km 467 ao km 483	467,000	483,000	16,000	out-14	jun-15	8,10	Andamento	1%
	BR-116 - do km 487 ao km 488	487,000	488,000	1,000	mai-14	jul-14	2,03	Concluída	100%
	BR-116 - do km 488 ao km 491	488,000	491,000	3,000	out-14	jun-15	8,10	Andamento	1%
	BR-116 - do km 491 ao km 497	491,000	497,000	6,000	abr-14	nov-14	7,13	Andamento	95%
	BR-116 - do km 501 ao km 502	501,000	502,000	1,000	out-14	jun-15	8,10	Andamento	1%
	BR-116 - do km 511 ao km 517	511,000	517,000	6,000	out-14	jun-15	8,10	Andamento	2%
	BR-116 - do km 518 ao km 520	518,000	520,000	2,000	out-14	jun-15	8,10	Andamento	1%
	BR-116 - do km 521 ao km 532	521,000	532,000	11,000	out-14	jun-15	8,10	Andamento	1%
	BR-116 - do km 533 ao km 535	533,000	535,000	2,000	out-14	jun-15	8,10	Iniciar	0%
	BR-116 - do km 536 ao km 537	536,000	537,000	1,000	out-14	jun-15	8,10	Iniciar	0%
	BR-116 - do km 540 ao km 543,2	540,000	543,200	3,200	out-14	jun-15	8,10	Iniciar	0%
	BR-116 - do km 633 ao km 636	633,000	636,000	3,000	jun-14	jul-14	1,00	Concluída	100%
	BR-116 - do km 637 ao km 638	637,000	638,000	1,000	jul-14	ago-14	1,03	Concluída	100%
	BR-116 - do km 768 ao km 774	768,000	774,000	6,000	mar-14	jul-14	3,77	Concluída	100%
	BR-116 - do km 827 ao km 832	827,000	832,000	5,000	mai-14	ago-14	3,40	Concluída	100%
	BR-116 - do km 840 ao km 842	840,000	842,000	2,000	jul-14	set-14	2,37	Andamento	90%
	BR-116 - do km 844 ao km 863	844,000	863,000	19,000	jul-13	ago-14	12,50	Concluída	100%
	BR-116 - do km 863 ao km 866	863,000	866,000	3,000	set-14	abr-15	7,07	Andamento	10%
	BR-116 - do km 867 ao km 869	867,000	869,000	2,000	set-14	abr-15	7,07	Andamento	15%
	BR-116 - do km 873 ao km 874	873,450	873,550	0,100	out-14	jan-15	3,07	Andamento	10%
	BR-116 - do km 872 ao km 903	872,000	903,000	31,000	set-14	abr-15	7,07	Andamento	8%
	BR-116 - do km 903 ao km 915	903,000	915,000	12,000	mai-13	mai-14	12,40	Concluída	100%
	BR-116 - do km 915 ao km 933	915,000	933,600	18,600	set-14	abr-15	7,07	Andamento	10%
2.3	Obras de Arte Especiais								
	BR-324 - km 599+300 - Passagem Superior Transversal	599+300	599+300	0,061	fev-14	nov-14	9	Andamento	50%
	BR-324 - km 586+700 - Ponte - Leste	586+700	586+718	0,018	set-14	jan-15	4	Andamento	3%
	BR-324 - km 576+514 - Ponte - Oeste	576+514	576+534	0,020	fev-14	dez-14	10	Andamento	60%
	BR-324 - km 572+100 - Ponte - Oeste	572+000	572+015	0,015	fev-14	set-14	7	Andamento	91%
	BR-324 - km 560+553 -Passagem inferior - Oeste	560+553	560+571	0,018	fev-14	out-14	8	Andamento	78%
	BR-324 - km 559+300 - Ponte - Oeste	559+300	559+310	0,010	fev-14	out-14	8	Andamento	50%
	BR-324 - km 559+300 - Ponte - Leste	559+300	559+325	0,025	jun-14	jan-15	7	Andamento	50%
	BR-324 - km 553+720 - Passagem Inferior - Oeste	553+720	553+744	0,024	fev-14	out-14	8	Andamento	70%
	BR-116 - km 428+265 - Ponte	428+265	428+265	0,103	set-14	jan-15	4	Andamento	60%
	BR-116 - km 431+760 - Viaduto	431+760	431+760	0,103	nov-14	mar-15	4	Andamento	2%
	BR-116 - km 434+290 - Ponte	434+290	434+320	0,030	jun-14	nov-14	5	Andamento	89%
	BR-116 - km 434+700 - Bueiro Celular	434+700	434+700	0,103	set-14	out-14	1	Concluída	100%
	BR-116 - km 435+500 - Bueiro Celular Tansversal	435+500	435+500	0,103	out-14	nov-14	2	Andamento	95%
	BR-116 - km 436+480 - Bueiro Celular Transversal	436+200	436+516	0,036	abr-14	out-14	6	Andamento	87%
	BR-116 - km 438+200 - Bueiro Celular Duplo Transversal	438+200	438+200	0,103	out-14	nov-14	1	Concluída	100%
	BR-116 - km 439+200 - Ponte	439+200	439+208	0,008	jun-14	jul-14	1	Concluída	100%
	BR-116 - km 446+000 - Bueiro Celular	446+000	446+000	0,103	out-14	dez-14	3	Andamento	10%
	BR-116 - km 447+000 - Ponte	447+000	447+008	0,008	jul-14	ago-14	1	Concluída	100%
	BR-116 - km 449+650 - Bueiro Celular Transversal	449+650	449+650	0,103	set-14	out-14	1	Concluída	100%
	BR-116 - km 450+400 - Bueiro Celular Transversal	450+400	450+400	0,103	set-14	out-14	1	Concluída	100%
	BR-116 - km 450+900 - Bueiro Celular Transversal	450+900	450+900	0,103	set-14	out-14	2	Concluída	100%
	BR-116 - km 453+245 - Ponte	453+245	453+287	0,042	abr-14	nov-14	7	Andamento	71%
	BR-116 - km 470+950 - Ponte	470+950	470+958	0,008	jul-14	set-14	2	Concluída	100%
	BR-116 - km 478+168 - Ponte	478+168	478+259	0,091	abr-14	dez-14	8	Andamento	49%
	BR-116 - km 480+500 - Ponte	480+500	480+500	0,103	set-14	out-14	1	Concluída	100%
	BR-116 - km 495+526 - Ponte	495+526	495+794	0,268	mar-14	mai-14	2	Concluída	100%
	BR-116 - km 546+200 - Bueiro	546+200	546+200	0,103	set-14	dez-14	3	Andamento	88%
	BR-116 - km 555+500 - Ponte	555+500	555+537	0,037	mar-14	dez-14	9	Andamento	58%
	BR-116 - km 644+860 - Ponte	644+860	644+866	0,006	mai-14	jun-14	1	Concluída	100%
	BR-116 - km 648+050 - Ponte	648+050	648+059	0,009	mar-14	mai-14	2	Concluída	100%
	BR-116 - km 650+677 - Ponte	650+677	650+687	0,010	fev-14	dez-14	10	Andamento	66%
	BR-116 - km 650+800 - Ponte	650+800	650+810	0,010	fev-14	dez-14	10	Andamento	60%
	BR-116 - km 653+800 - Ponte	653+800	653+813	0,013	fev-14	jan-15	11	Andamento	59%
	BR-116 - km 690+300 - Ponte	690+300	690+342	0,042	nov-13	jan-15	14	Andamento	70%
	BR-116 - km 909+800- Ponte	909+800	909+903	0,103	mar-14	jul-14	4	Concluída	100%
2.3	Terraplenos e Estruturas de Contenção								
	BR-324 - km 547+200 - Pista Oeste	547+200	547+300	0,100	out-13	mar-14	5	Concluída	100%
	BR-116 - km 524+630 - Sul	524+630	524+830	0,200	mai-14	ago-14	3	Concluída	100%
	BR-116 - km 547+810 - Norte/Sul	547+810	547+825	0,015	mai-14	jun-14	1	Concluída	100%
	BR-116 - km 553+940 - Norte/Sul	553+940	553+980	0,040	nov-14	jan-15	2	Iniciar	0%
	BR-116 - km 554+340 - Sul	554+340	554+590	0,250	nov-14	jan-15	2	Iniciar	0%
	BR-116 - km 596+640 - Norte/Sul	596+640	596+900	0,260	set-13	mar-14	6	Concluída	100%
	BR-116 - km 598+275 - Norte	598+275	598+289	0,014	jun-14	nov-14	5	Concluída	100%
	BR-116 - km 604+470 - Norte/Sul	604+470	604+482	0,014	jun-14	nov-14	5	Andamento	94%
	BR-116 - km 608+640 - Norte/Sul	608+640	608+760	0,120	mai-14	ago-14	3	Concluída	100%
	BR-116 - km 609+470 - Norte/Sul	609+470	610+045	0,575	out-13	mar-14	5	Concluída	100%
	BR-116 - km 645+470 - Norte/Sul	645+470	645+575	0,075	mai-14	nov-14	6	Andamento	41%
	BR-116 - km 652+950 - Sul	652+950	653+230	0,280	jan-14	abr-14	3	Concluída	100%
	BR-116 - km 705+080 - Norte/Sul	705+080	705+080	0,260	out-14	jan-15	3	Andamento	50%
	BR-116 - km 708+465 - Norte	708+465	708+465	0,014	set-14	jan-15	3	Andamento	75%
	BR-116 - km 713+790 - Norte/Sul	713+790	713+790	0,014	ago-14	jan-15	5	Andamento	80%
	BR-116 - km 717+800 - Sul	717+800	717+800	0,120	out-14	jan-15	2	Andamento	40%
	BR-116 - km 718+000 - Sul	718+000	718+000	0,575	jul-14	out-14	3	Concluída	100%
	BR-116 - km 718+170 - Sul	718+170	718+170	0,075	jul-14	out-14	3	Concluída	100%
	BR-116 - km 724+440 - Sul	724+440	724+440	0,280	out-14	jan-15	3	Andamento	60%
	BR-116 - km 728+080 - Norte/Sul	728+080	728+080	0,120	out-14	out-14	0	Concluída	100%
	BR-116 - km 734+730 - Norte	734+730	734+760	0,030	abr-14	out-14	6	Andamento	95%
	BR-116 - km 734+730 - Sul	734+730	734+760	0,030	abr-14	out-14	6	Andamento	95%
	BR-116 - km 785+970 - Norte	785+970	786+035	0,065	mai-14	out-14	5	Andamento	95%
	BR-116 - km 785+970 - Sul	785+965	785+989	0,065	jul-14	ago-14	1	Concluída	100%
	BR-116 - km 790+100 - Norte	790+100	790+185	0,085	set-13	jan-14	4	Concluída	100%
2.7	Iluminação								
	BR-116 km 529+010 ao 529+450 - Povoado da Torr	529,01	529,45	0,44	fev-14	jul-14	5	Concluída	100%
	BR-116 km 566+800 ao 567+220 - Nova Itarana	566,8	567,22	0,42	fev-14	jul-14	5	Concluída	100%
	BR-116 km 628+120 ao 628+640 - Povoado Tatu	628,12	628,64	0,52	fev-14	jul-14	5	Concluída	100%
	BR-116 km 652+820 ao 653+120 - Lafaiete Coutinh	652,82	653,12	0,3	fev-14	jul-14	5	Concluída	100%
	BR-116 km 782+770 ao 783+640 - Trevo Lucaia	782,77	783,64	0,87	fev-14	jul-14	5	Concluída	100%
	BR-116 km 826+860 ao 828+740 - Atacadão até a entrada de V. da Conquista	826,86	828,74	1,88	fev-14	jul-14	5	Concluída	100%
	BR-116 km 812+980 ao 816+020 - Saída de Vitória da Conquista	812,98	816,02	3,04	fev-14	jul-14	5	Concluída	100%
	BR-116 km 832+340 ao 833+900 - Povoado Pé de C	832,34	833,9	1,56	fev-14	jul-14	5	Concluída	100%
	BR-116 km 845+980 ao 846+420 - Lagoa de São Jo	845,98	846,42	0,44	fev-14	jul-14	5	Concluída	100%
	BR-116 km 869+400 ao 870+120 - Entrada de Inhob	869,4	870,12	0,72	fev-14	jul-14	5	Concluída	100%
	BR-116 km 870+140 ao 871+240 - Povoado Veredi	870,14	871,24	1,1	fev-14	jul-14	5	Concluída	100%
	BR-116 km 885+560 ao 886+000 - Povoado de Ág	885,56	886	0,44	fev-14	jul-14	5	Concluída	100%
	BR-116 km 006+420 ao km 008+860 Av. Brumado	6,42	8,86	3,66	fev-14	jul-14	5	Concluída	100%
	BR-116 km 011+600 ao 013+100 - Campinhos	11,6	13,1	1,5	fev-14	jul-14	5	Concluída	100%
	BR-116 km 016+400 ao 017+460 - Ilhéus e Urbis	16,4	17,46	1,06	fev-14	jul-14	5	Concluída	100%
	BR-116 km 024+400 ao 025+200 - Barra do Choça	24,4	25,2	1,6	fev-14	jul-14	5	Concluída	100%
	BR-116 km 484+120 ao km 486+280	484,12	486,28	2,16	fev-14	jul-14	5	Concluída	100%

Status:

Iniciar
Andamento
Concluída

2.3. Cronograma Físico

Tabela 03 – Cronograma Físico

CRONOGRAMA FÍSICO (%)

Item	Descrição	2014												2015	Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	
	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO														
1	BR-324 - do km 519 ao km 547/ Pista Leste				5%	5%	5%	5%	5%	15%	20%	20%	15%	5%	100%
2	BR-324 - do km 548 ao km 580/ Pista Leste		5%	5%	5%	10%	15%	15%	15%	10%	10%	7%	2%	1%	100%
3	BR-324 - do km 581 ao km 603/ Pista Leste							25%	25%	25%	25%				100%
4	BR-324 - do km 617 ao km 582/ Pista Oeste								6%	20%	24%	30%	20%		100%
5	BR-324 - do km 545 ao km 541/ Pista Leste			5%	10%	5%	5%	5%	10%	25%	25%	10%			100%
6	BR-116 - do km 447 ao km 454				2%	2%	2%	2%	2%	45%	45%				100%
7	BR-116 - do km 491 ao km 497				5%	15%	30%	30%	15%	2%	2%	1%			100%
9	BR-116 - do km 840 ao km 842							30%	55%	15%					100%
	RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS														
10	BR-324 - km 599+300 - Passagem Superior Transversal		1%	2%	5%	5%	10%	10%	5%	25%	25%	12%			100%
8	BR-324 - km 586+700 - Ponte - Leste									10%	25%	30%	20%	15%	100%
11	BR-324 - km 576+514 - Ponte - Oeste		4%	5%	5%	10%	10%	10%	15%	10%	15%	11%	5%		100%
12	BR-324 - km 572+100 - Ponte - Oeste		4%	6%	10%	15%	20%	15%	15%	15%					100%
13	BR-324 - km 560+553 -Passagem inferior - Oeste		6%	6%	8%	10%	10%	10%	11%	20%	19%				100%
14	BR-324 - km 559+300 - Ponte - Oeste		2%	2%	8%	10%	10%	12%	20%	22%	14%				100%
15	BR-324 - km 559+300 - Ponte - Leste					5%	10%	10%	20%	20%	10%	10%	10%	5%	100%
16	BR-324 - km 553+720 - Passagem Inferior - Oeste		6%	6%	8%	10%	10%	10%	12%	20%	18%				100%
17	BR-116 - km 434+290 - Ponte						10%	15%	16%	22%	23%	14%			100%
18	BR-116 - km 436+480 - Bueiro Celular Transversal				10%	10%	10%	15%	20%	20%	15%				100%
19	BR-116 - km 453+245 - Ponte				2%	5%	6%	6%	6%	27%	30%	18%			100%
20	BR-116 - km 470+950 - Ponte							40%	50%	10%					100%
21	BR-116 - km 478+168 - Ponte				2%	2%	3%	6%	8%	20%	30%	15%	14%		100%
22	BR-116 - km 555+500 - Ponte			2%	8%	10%	10%	10%	10%	15%	15%	12%	8%		100%
23	BR-116 - km 650+677 - Ponte		5%	5%	5%	10%	10%	10%	15%	15%	10%	10%	5%		100%
24	BR-116 - km 650+800 - Ponte		3%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	15%	15%	9%	8%		100%
25	BR-116 - km 653+800 - Ponte		4%	5%	8%	12%	10%	10%	10%	12%	10%	9%	5%	5%	100%
	RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS														
26	BR-116 - km 553+940 - Norte/Sul											20%	50%	30%	100%
27	BR-116 - km 554+340 - Sul											20%	50%	30%	100%
28	BR-116 - km 604+470 - Norte/Sul							8%	10%	14%	50%	18%			100%
29	BR-116 - km 645+470 - Norte/Sul					10%	15%	15%	20%	20%	10%	10%			100%
30	BR-116 - km 734+730 - Norte				10%	10%	25%	25%	25%	3%	2%				100%
31	BR-116 - km 734+730 - Sul				10%	10%	25%	25%	25%	3%	2%				100%
32	BR-116 - km 785+970 - Norte					10%	15%	35%	35%	3%	2%				100%
Geral	Parcial	0%	1%	2%	4%	6%	9%	13%	15%	15%	15%	8%	6%	2%	97%
	Acumulado	0%	1%	3%	7%	13%	22%	35%	51%	66%	81%	89%	95%	97%	97%

Legenda:

Previsto

GERAL



2.4. Avanço Físico

Tabela 04 – Avanço Físico das Obras

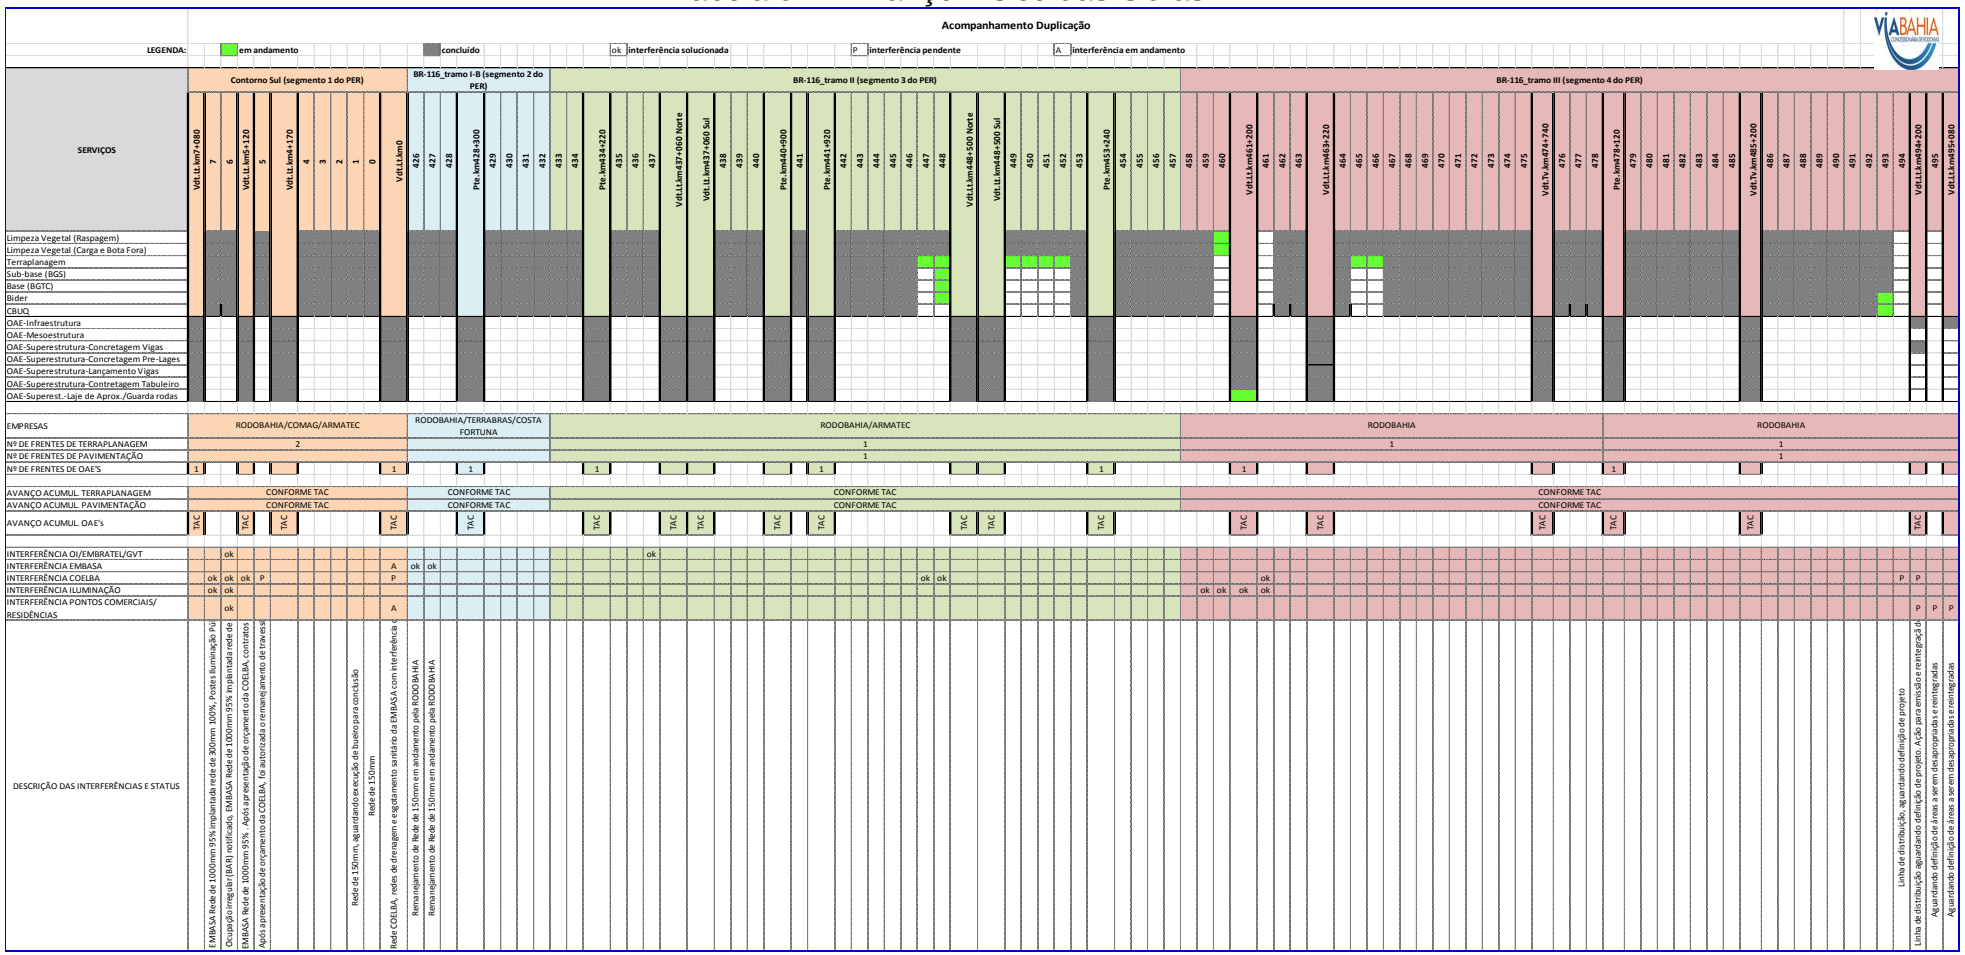

3. Frente de Serviço Operacional

Estão concluídas as obras de implantação do Sistema de Controle de Tráfego na BR-324 e na BR-116, com o quantitativo total previsto, completamente instalado, quais sejam: 15 equipamentos de detecção e sensoriamento de pista, 05 painéis de mensagens variáveis fixos, 02 estações meteorológicas, 100 equipamentos de circuito fechado de TV, 03 Painéis de Mensagens Variável móveis, 07 equipamentos do sistema de controle de velocidade e 06 detectores de altura.

3.1. Status dos Serviços Operacionais

Tabela 05 – Status dos Serviços Operacionais

Serviços Operacionais

Item PER	INFRAESTRUTURA / SERVIÇO OPERACIONAL		Quantidade (Unidade)	Localização		Município		Acompanhamento	
				Rodovia	Km	Cidade	Estado	Status	Realizado (%)
8.1	Centro de Controle Operacional		1	BR-324	550+900	Amélia Rodrigues	BA	Concluída	100%
8.8	Equipamentos e Veículos da administração		17	BR-324	550+900	Amélia Rodrigues	BA	Concluída	100%
8.3.1	Sistemas de controle de tráfego	Equipamentos de detecção e sensoriamento de pista	22	-	-	-	BA	Concluída	100%
8.3.2		Painéis fixos de mensagens variáveis	5	-	-	-	BA	Concluída	100%
8.3.3		Painéis móveis de mensagens variáveis	3	-	-	-	BA	Concluída	100%
8.3.5		Sistema de inspeção de tráfego	100	-	-	-	BA	Concluída	100%
8.3.7		Sistema de detecção de altura	6	-	-	-	BA	Concluída	100%
8.3.6		Sistema de Circuito Fechado de TV	100	-	-	-	BA	Concluída	100%
8.3.8		Sistema de controle de velocidade	7	-	-	-	BA	Concluída	100%
8.6.1.1	Sistemas de atendimento ao usuário	Atendimento médico de emergência	15	-	-	-	BA	Concluída	100%
8.6.1.2		Socorro mecânico	15	-	-	-	BA	Concluída	100%
8.6.1.3		Combate a incêndios e apreensão de animais na	3	-	-	-	BA	Concluída	100%
8.6.2		Sistema de informações aos usuários	3	-	-	-	BA	Concluída	100%
8.6.3		Sistema de reclamações e sugestões dos usuários	2	-	-	-	BA	Concluída	100%
8.2		Pontos de apoio e parada para os usuários	7	-	-	-	BA	Concluída	100%
9.0	Sistemas de pedágio e controle de arrecadação		7	BR-324	597+728	Simões Filho	BA	Concluída	100%
				BR-324	558+616	Amélia Rodrigues	BA	Concluída	100%
				BR-116	482+138	Rafael Jambeiro	BA	Concluída	100%
				BR-116	566+405	Brejões/Nova Itarana	BA	Concluída	100%
				BR-116	698+410	Jequié	BA	Concluída	100%
				BR-116	773+819	Planalto	BA	Concluída	100%
				BR-116	873+499	Vitória da Conquista	BA	Concluída	100%
8.5	Sistema de Comunicação		-	-	-			Concluída	100%
8.4.2.2	Sistema de Pesagem	Novos postos de pesagem	4	BR-324	558+616	Terra Nova	BA	Andamento	3%
				BR-116	468+000	Feira de Santana	BA	Iniciar	0%
				BR-116	663+629	Jequié	BA	Iniciar	0%
				BR-116	840+757	Vitória da Conquista	BA	Iniciar	0%
8.7	Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial		3	-	-			Concluída	100%
8.4.1.1	Postos da PRF	Reforma de postos existentes	5	BR-324	604+000	Simões Filho	BA	Concluída	100%
				BR-116	429+500	Feira de Santana	BA	Concluída	100%
				BR-116	677+200	Jequié	BA	Concluída	100%
				BR-116	830+000	Vitória da Conquista	BA	Concluída	100%
				BR-116	931+700	Divisa BA/MG	BA	Iniciar	0%

Status:

- Iniciar
- Andamento
- Concluída

4. Relação de Equipamento e Pessoal

Tabela 06 – Relação de Equipamentos e Recursos

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL		
Item	**Descrição**	**Quantidade**
1	**Pessoal**	
1.1	Administração Central	66
1.2	Administração Local	204
1.3	Operacional	522
Total		**792**
2	**Equipamentos**	
2.1	Veículos de inspeção de tráfego	17
2.2	Ambulâncias de Resgate – Tipo C	13
2.3	Ambulâncias de suporte avançado – Tipo D	2
2.4	Guinchos Leves	11
2.5	Guincho Pesado	4
2.6	Caminhão Pipa	3
2.7	Caminhão para apreensão de animais	3
Total		**53**

5. Relatório Fotográfico

Figura 01 – Terraplenagem

Figura 02 – Pavimentação

Figura 03 – Pavimentação

Figura 04 – Obra de Arte Especial

Figura 05 – Obra de Arte Especial

Figura 06 – Sinalização Vertical

Figura 07 – Implantação de Defensas Metálicas

Figura 08 – Sinalização Horizontal

6. Considerações Finais

- *No aludido documento, a VIABAHIA Concessionária de Rodovias S.A (VIABAHIA) encaminha todas as informações solicitadas pela União, representada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), e comunica aos usuários das rodovias concedidas, através dos referidos endereços eletrônicos sobre o andamento das principais obras desenvolvidas por esta Concessionária.*
- *Referências: Ofícios Circulares nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014 e n.º 056/2014/SUINF*

7. Termo de Encerramento

O presente Relatório Mensal se completa com 20 (*vinte*) folhas devidamente identificadas e numeradas.
